

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO	
	ACTA DE ENTREGA - PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	
	Código: PM03-PR07-F06	Versión: 2.0

ACTA DE ENTREGA - PLANEAMIENTO SEMAFORICO

DATOS GENERALES	COMUNICACIONES	FUNCIONAMIENTO	GRUPOS	MODIFICACIONES
NÚMERO EXTERNO: 2935	CONEXION: CENTRAL	Activación de sonoro		Optimización Intersección
EQUIPO: C900	PROTOCOLO: OCIT2,0	Brechas	2	
ZONA PLANEAMIENTO: CENTRO	FUNCIONAMIENTO CA - TA	Fases por demanda vehicular		
ZONA AUTOMÁTICA: 2401	TIPO DE PROGRAMACION LOGICA PDM	Fases por demanda peatonal		
		Fases por demanda peatonal sonoro		

DIRECCIÓN	FASES	DISPOSITIVOS	ESTADO DISPOSITIVOS	GRUPOS COMPLEMENTO
ID SIG: 870 KR 104 X DG 16	2	Video Detector	Conectado - - -	CR LP BOSEP PD

CANTIDADES MODIFICADAS:	Cant.		Cant.		Cant.	
Esquema	1	Tabla Detectores	1	Archivo Digital Planeamiento	1	SEMA_2935_Versión1.sop6
Automático Interno (AI)	1	Parámetros TA		Archivo Digital de Simulación	1	SEMA_2935_Versión1.sop6
Matriz de conflictos (MC)		Parámetros CA		Protocolo de Prueba PS	1	PS_2
Matriz de Tiempos Intermedios (MI)		Tabla de Condiciones / Diagrama de Flujo				
Plan de Conexión (PC)		Plan Secuencia de Fases (SF)				
Plan de Desconexión (PD)		Transiciones de Fase (TF)	2/2			
Planes de Señales (PS)	9/9	Planes de Permisividad (PP)	9/9			


OBSERVACIONES:	SE ACTUALIZA PLANEAMIENTO, SE ACTUALIZA ESQUEMA DE ACUERDO A NUEVOS BLOQUES. SE REUBICA W2 EN EL ACCESO DEL GRUPO 2. SE INSTALA W3 EN EL ACCESO DEL GRUPO 3 CON SUS RESPECTIVOS CAMPOS DE DETECCIÓN QUE SON PARA CONTEO DE INES. SE ANEXA Y ACTUALIZA AUTOMATICO INTERNO DE ACUERDO AL VIGENTE PARA ESTA ZONA AUTOMATICA, SE ACTUALIZA TABLA DE DETECTORES. SE OPTIMIZAN PLANES DE SEÑALES. SE OPTIMIZAN TRANSICIONES DE FASES. SE OPTIMIZAN PLANES DE PERMISIVIDAD.
----------------	--

PROCESO	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Ing. Arturo Coy Alvarado - Profesional universitario SDM		1/04/2025
Aprobó :	Profesional Especializado SDM		14/04/2025

CONVENCIONES:	Modo Local: TF: Tiempos Fijos - TA: Trafico Actuado Modo Central: CA: Central Adaptativa - R: Responsivo - RP: Responsivo Pasivo - BT: Basado Tiempo	NOTA:	* Para programación SL, los parametros se encuentran en la SF. * Los cambios se resaltan en color gris
---------------	---	-------	---

OPERACIONES	
Operaciones _ Contrato de Mantenimiento	Operaciones SDM
	 Manuel Gómez M. 29/04/2025
Operador	Fecha Implementación:
John Acosta 	30/04/2025

Esquema

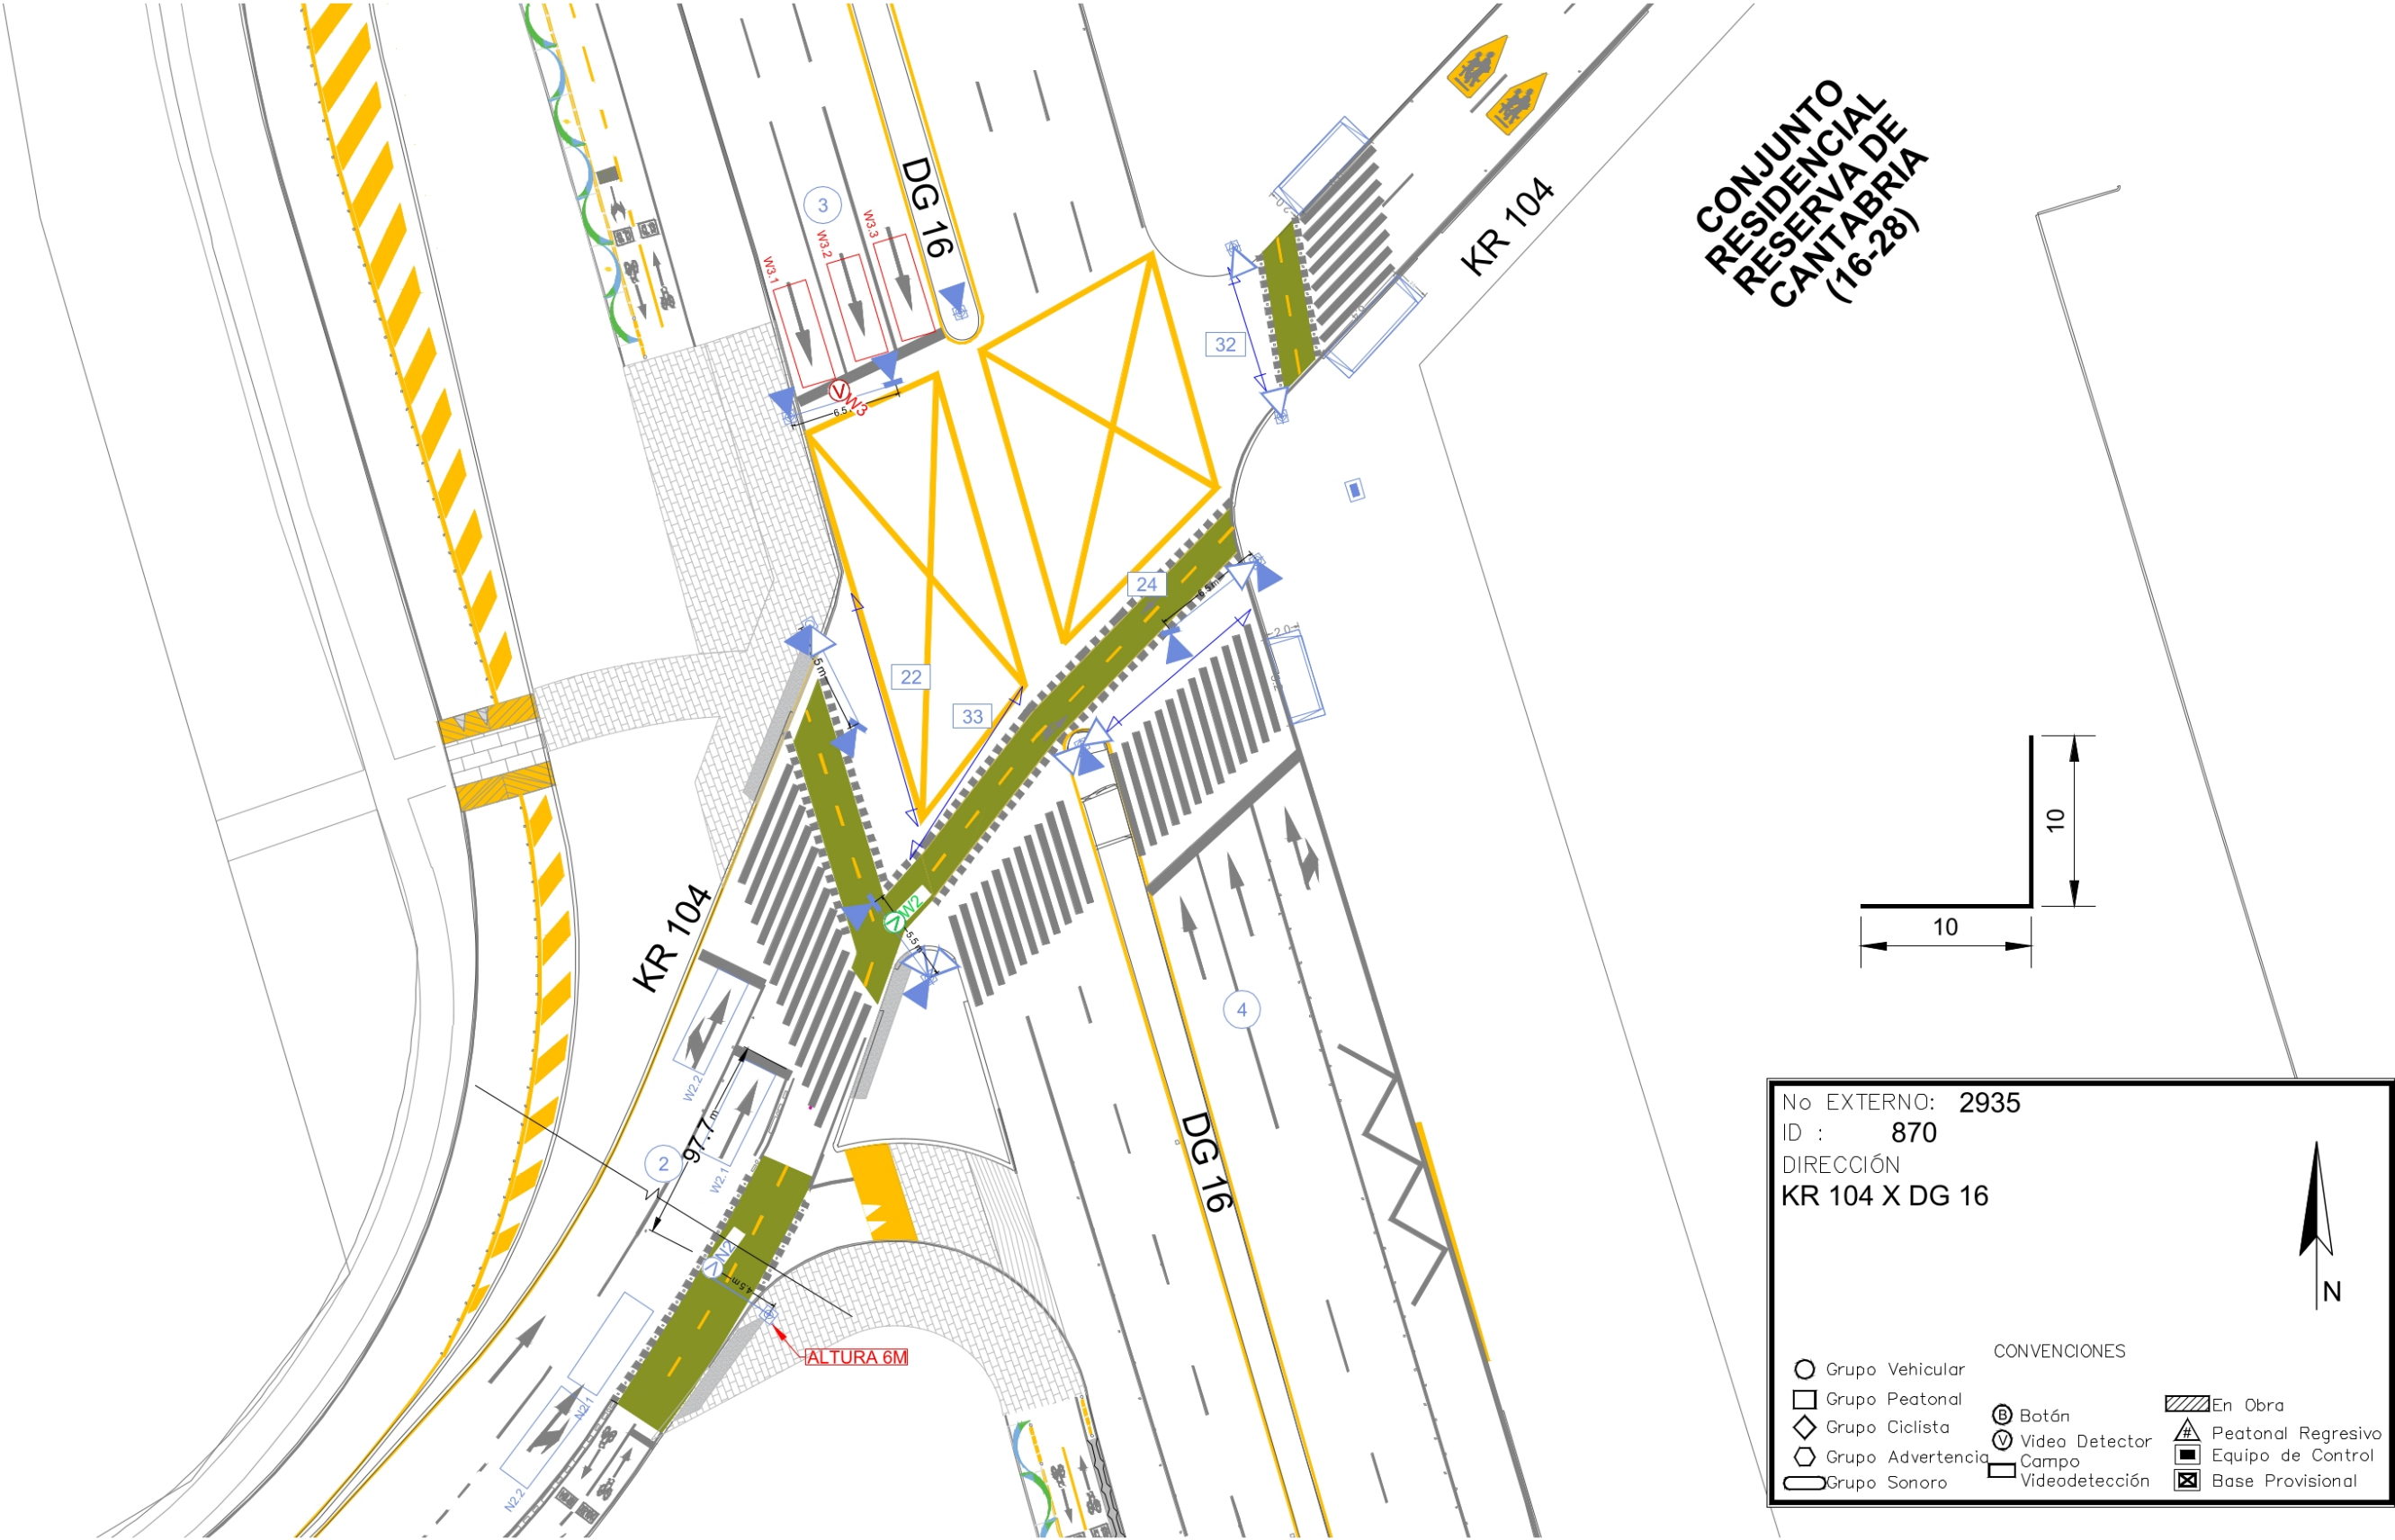

Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:05
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización		Sittraffic Office	

Referencias del grupo de señales

Matrices de conflicto:

N. °	Nombre	Nombre corto	Descripción
1	MC_C900_2935	MC_C900_2935	

		GS de entrada																				
			2	1		3	2		4	3		22	4		24	5		32	6		33	7
GS de despeje																						
1	2				X				X			X						X				
2	3	X																		X		
3	4	X													X							
4	22	X																				
5	24								X													
6	32	X																				
7	33			X																		

Último usuario / Última modificación: Ing. Arturo Coy Alvarado - 28/03/2025 12:05:36

Verificado por / el:

Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:05
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización		Sittraffic Office	

Matrices del tiempo intermedio:

N. °	Nombre	Nombre corto	Descripción	MC	CI	Determinación	BDS/SIM	SrIT	DT(SDM)
1	MI_C900_2935	MI_C900_2935		MC_C900_2935	CTI (ZB) 1	Efectiva	Matriz de TINT 1	1	1

	GS de entrada	1	2	3	4	22	24	32	33
GS de despeje		2	3	4	22	24	32	33	
1	2		6	7	5		10		
2	3	5						8	
3	4	4				5			
4	22	16							
5	24		10						
6	32	4							
7	33		8						


Último usuario / Última modificación: Ing. Arturo Coy Alvarado - 28/03/2025 12:05:28

Verificado por / el:


Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:05
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización		Sitraffic Office	

Activar programas \ PC_C900_2935

Ser. no.	O-Nr.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Duración	MTI(ZZ)	MDI	MDF	Subnodo(TK)
1	1	PC_C900_2935	PC_C900_2935		21	MI_C900_2935			Hpi 1

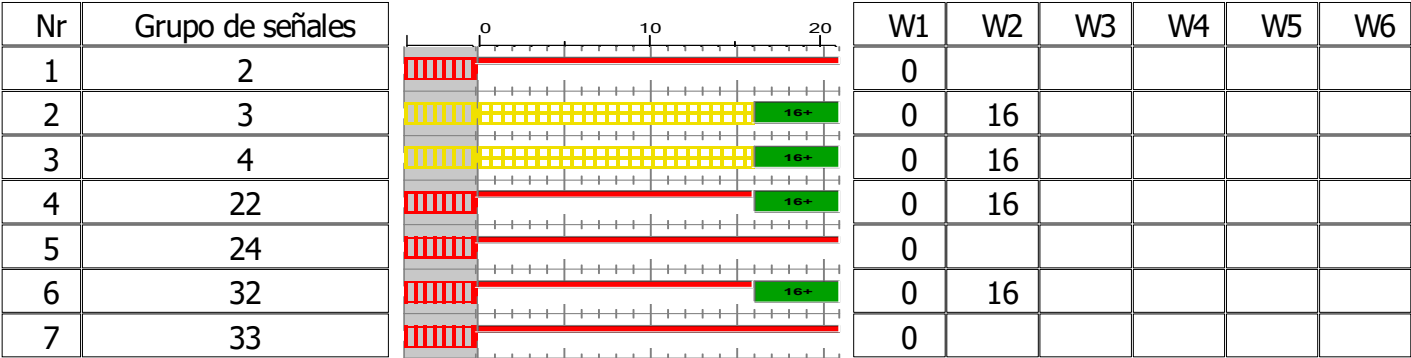



= Verde = Rojo = R.int_1Hz = Aint_2Hz = Aint_1Hz



Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:05
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización			Sittraffic Office

Programas de desconexión \ PD_C900_2935

Ser. no.	O-Nr.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Duración	MTI(ZZ)	MDI	MDF	Subnodo(TK)
1	1	PD_C900_2935	PD_C900_2935		21	MI_C900_2935			Hpi 1

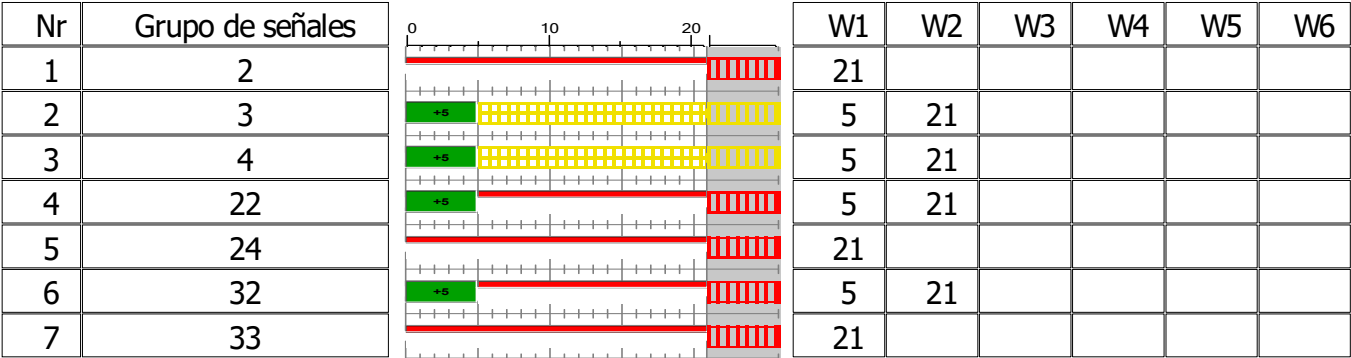


Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:05
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización			Sittraffic Office

Programas de señal \ PS_1_C900_2935


Ser. no.	O-Nr.	Nombre corto	Nombre	Descripción	Tiempo de Ciclo	No de Com. Dispo.	Tipo	Desfase	Tabla de volúmenes	MTI(ZZ)	MDI	MDF	COORDINACION	S-Encendido	S-Off	@Point-in-time values based on
1	1	PS_1_C900_2935	PS_1_C900_2935	Automatically generated	120	1	SG	0		MI_C900_2935			0	PC_C900_2935	PD_C900_2935	0

Grupo de señales
2
3
4
22
24
32
33

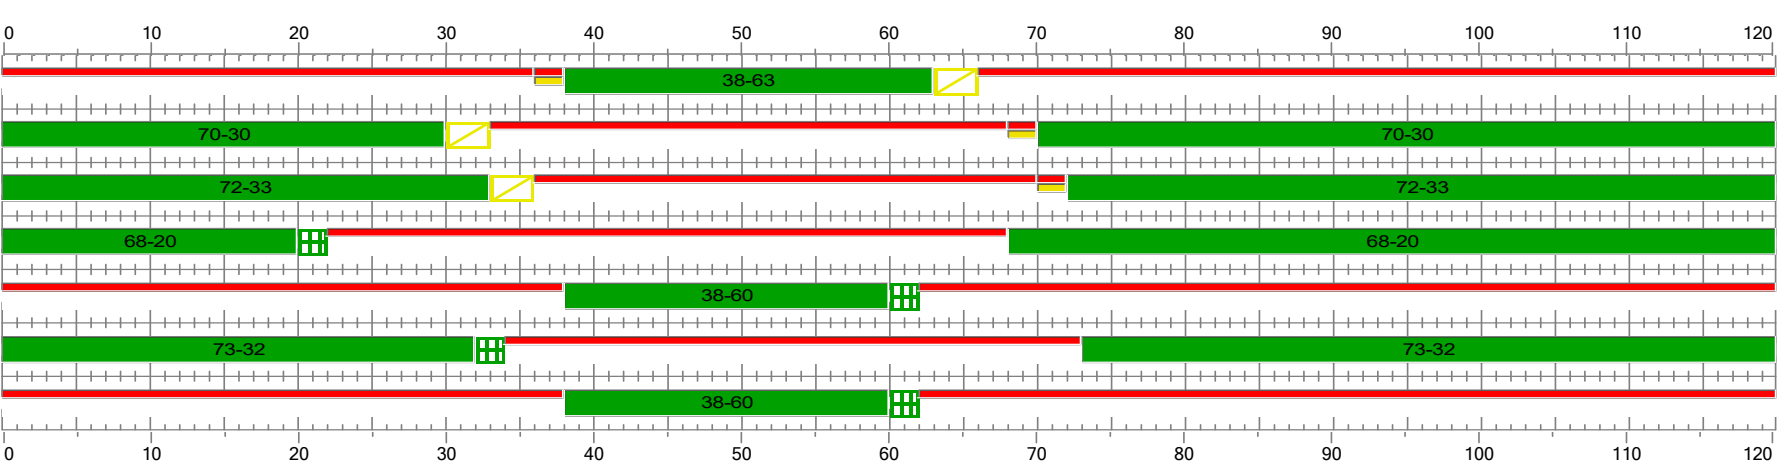

TVI(TFA)1	TVF(TFE)1	TFD1	RES
38	63	25	20
70	30	80	75
72	33	81	76
68	22	74	67
38	62	24	17
73	34	81	74
38	62	24	17

= Verde = Rojo = v.int_2Hz = Amarillo = RojoAmarillo

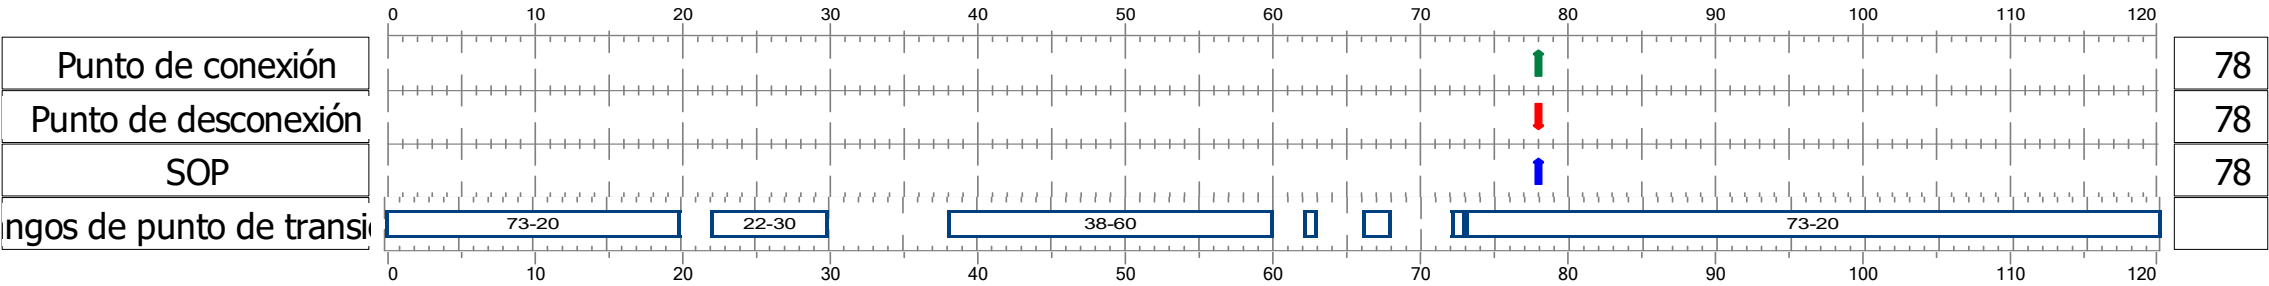


Último usuario / Última actualización = Ing. Arturo Coy Alvarado / 28/03/2025 2:00:10 p. m.

Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:05
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización			Sittraffic Office

Programas de señal \ PS_2_C900_2935


Ser. no.	O-Nr.	Nombre corto	Nombre	Descripción	Tiempo de Ciclo	No de Com. Dispo.	Tipo	Desfase	Tabla de volúmenes	MTI(ZZ)	MDI	MDF	COORDINACION	S-Encendido	S-Off	@Point-in-time values based on
2	2	PS_2_C900_2935	PS_2_C900_2935	Automatically generated	120	2	SG	0		MI_C900_2935			0	PC_C900_2935	PD_C900_2935	0

Grupo de señales
2
3
4
22
24
32
33

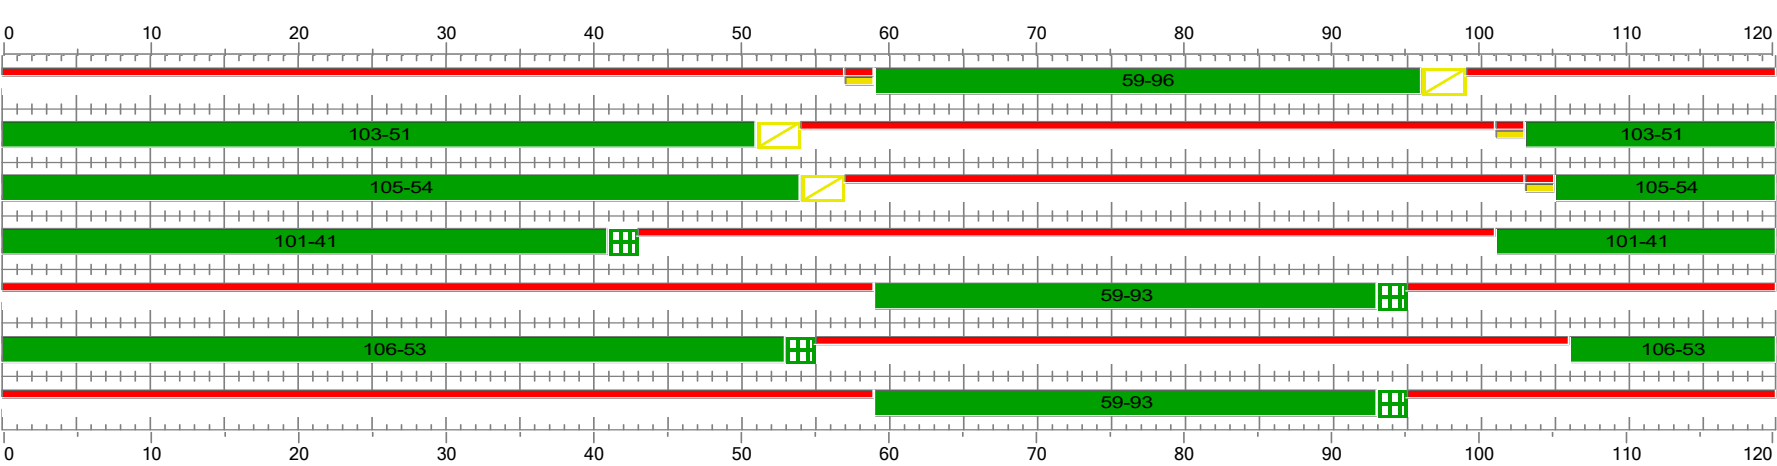

TVI(TFA)1	TVF(TFE)1	TFD1	RES
59	96	37	32
103	51	68	63
105	54	69	64
101	43	62	55
59	95	36	29
106	55	69	62
59	95	36	29

= Verde = Rojo = v.int_2Hz = Amarillo = RojoAmarillo

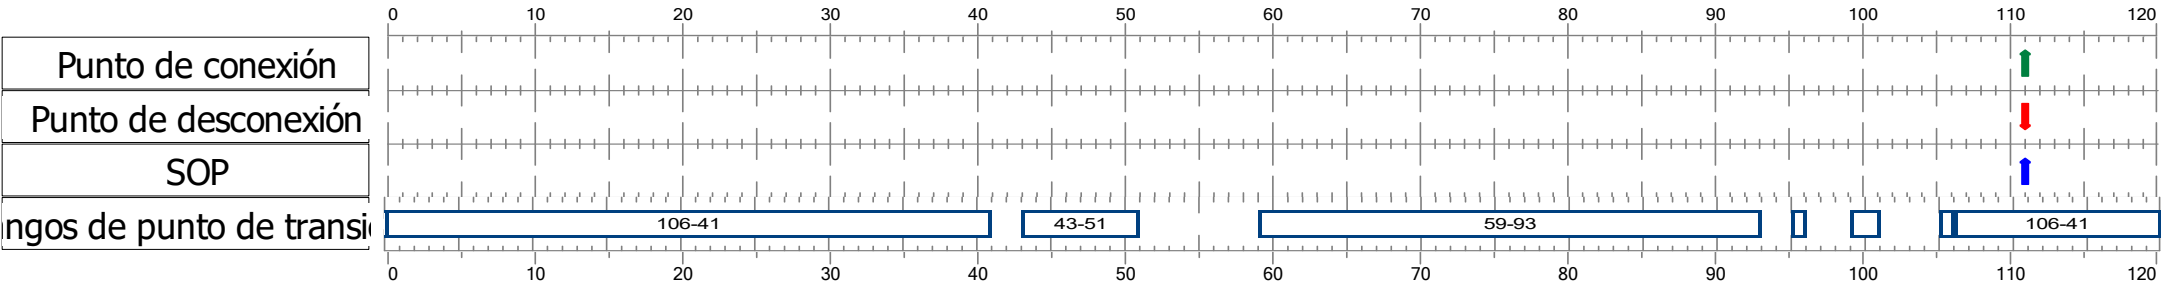


Último usuario / Última actualización = Ing. Arturo Coy Alvarado / 28/03/2025 2:00:36 p. m.

Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:05
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización			Sittraffic Office

Programas de señal \ PS_3_C900_2935


Ser. no.	O-Nr.	Nombre corto	Nombre	Descripción	Tiempo de Ciclo	No de Com. Dispo.	Tipo	Desfase	Tabla de volúmenes	MTI(ZZ)	MDI	MDF	COORDINACION	S-Encendido	S-Off	@Point-in-time values based on
3	3	PS_3_C900_2935	PS_3_C900_2935	Automatically generated	120	3	SG	0		MI_C900_2935			0	PC_C900_2935	PD_C900_2935	0

Grupo de señales
2
3
4
22
24
32
33

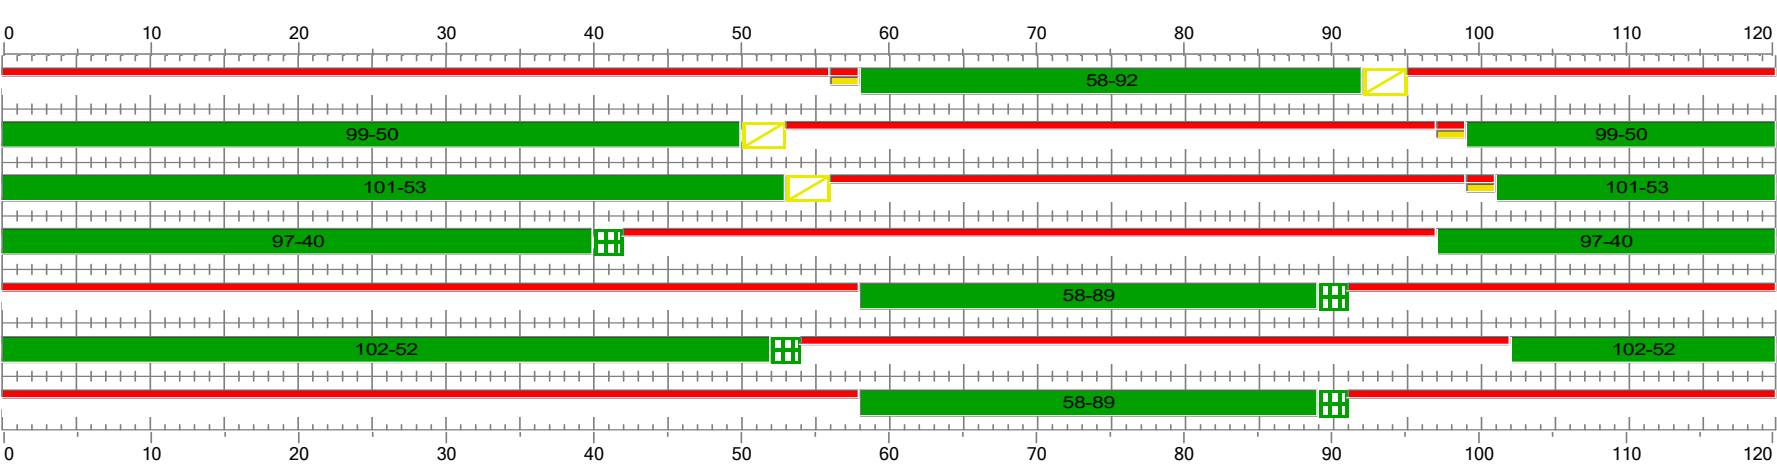

TVI(TFA)1	TVF(TFE)1	TFD1	RES
58	92	34	29
99	50	71	66
101	53	72	67
97	42	65	58
58	91	33	26
102	54	72	65
58	91	33	26

= Verde = Rojo = v.int_2Hz = Amarillo = RojoAmarillo

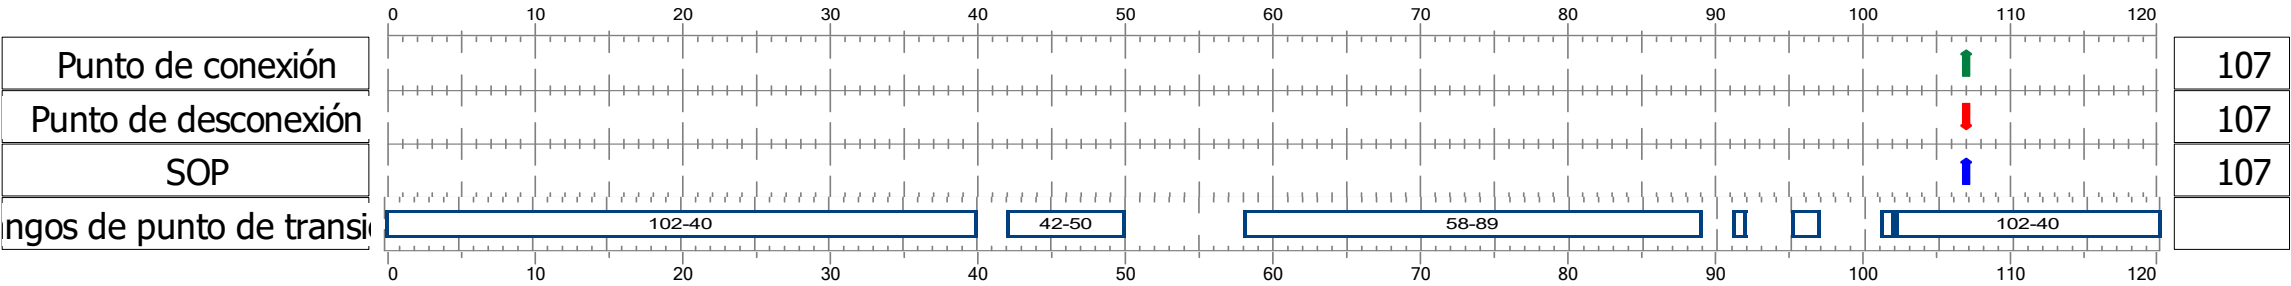


Último usuario / Última actualización = Ing. Arturo Coy Alvarado / 28/03/2025 1:59:47 p. m.

Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:05
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización			Sitraffic Office

Programas de señal \ PS_4_C900_2935

Ser. no.	O-Nr.	Nombre corto	Nombre	Descripción	Tiempo de Ciclo	No de Com. Dispo.	Tipo	Desfase	Tabla de volúmenes	MTI(ZZ)	MDI	MDF	COORDINACION	S-Encendido	S-Off	@Point-in-time values based on
4	4	PS_4_C900_2935	PS_4_C900_2935	Automatically generated	120	4	SG	0		MI_C900_2935			0	PC_C900_2935	PD_C900_2935	0


Grupo de señales
2
3
4
22
24
32
33

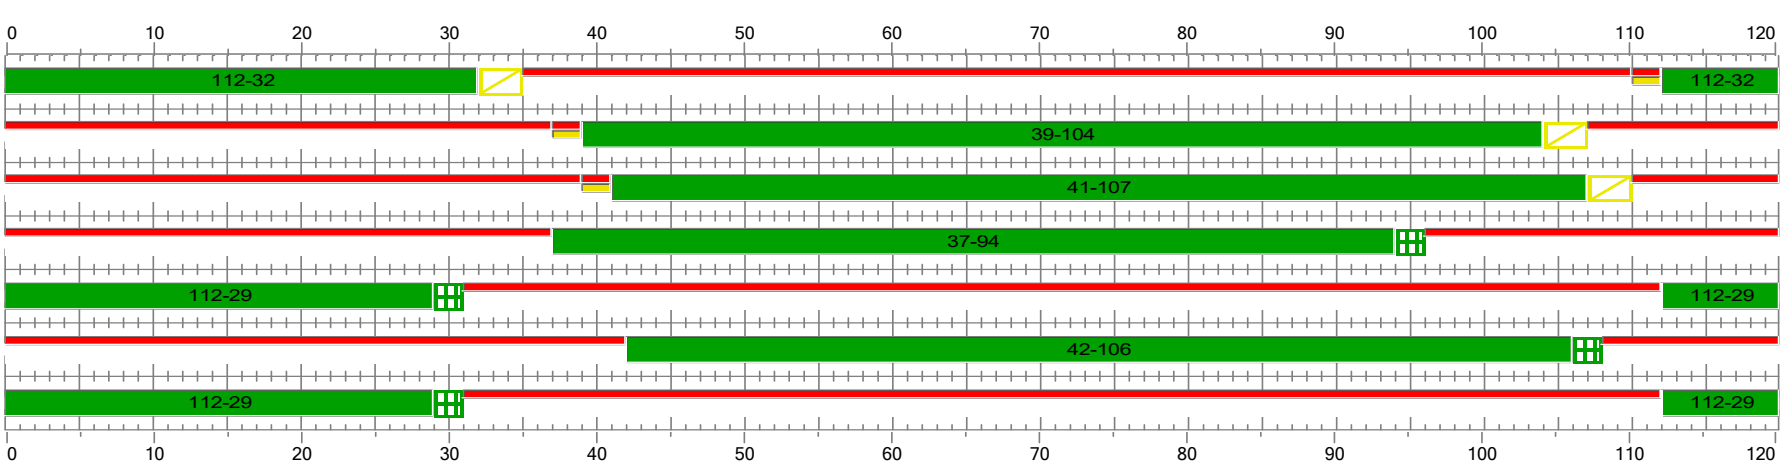

TVI(TFA)1	TVF(TFE)1	TFD1	RES
112	32	40	35
39	104	65	60
41	107	66	61
37	96	59	52
112	31	39	32
42	108	66	59
112	31	39	32

= Verde = Rojo = v.int_2Hz = Amarillo = RojoAmarillo

Punto de conexión
Punto de desconexión
SOP
ngos de punto de transi

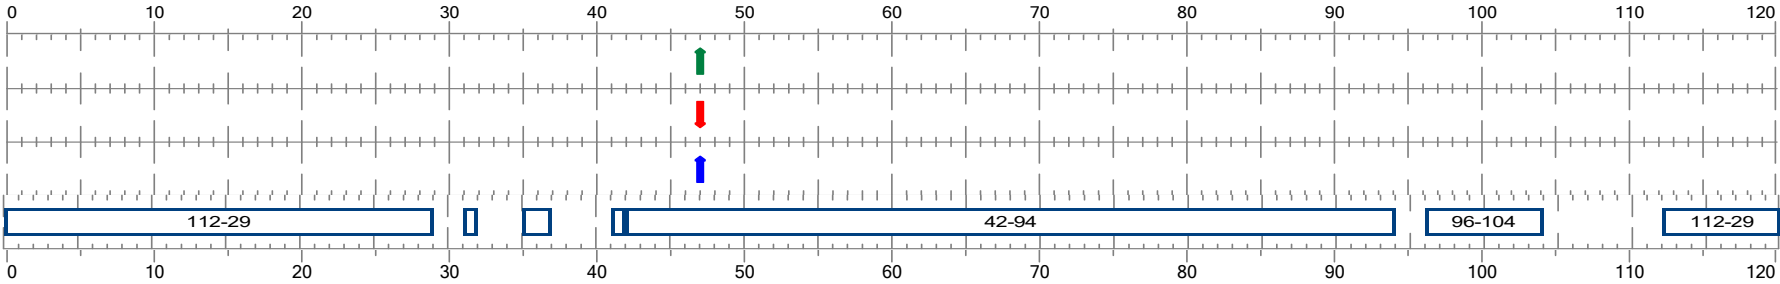

47
47
47


Último usuario / Última actualización = Ing. Arturo Coy Alvarado / 28/03/2025 2:01:57 p. m.

Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:05
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización			Sitraffic Office

Programas de señal \ PS_5_C900_2935


Ser. no.	O-Nr.	Nombre corto	Nombre	Descripción	Tiempo de Ciclo	No de Com. Dispo.	Tipo	Desfase	Tabla de volúmenes	MTI(ZZ)	MDI	MDF	COORDINACION	S-Encendido	S-Off	@Point-in-time values based on
5	5	PS_5_C900_2935	PS_5_C900_2935	Automatically generated	100	5	SG	0		MI_C900_2935			0	PC_C900_2935	PD_C900_2935	0

Grupo de señales
2
3
4
22
24
32
33

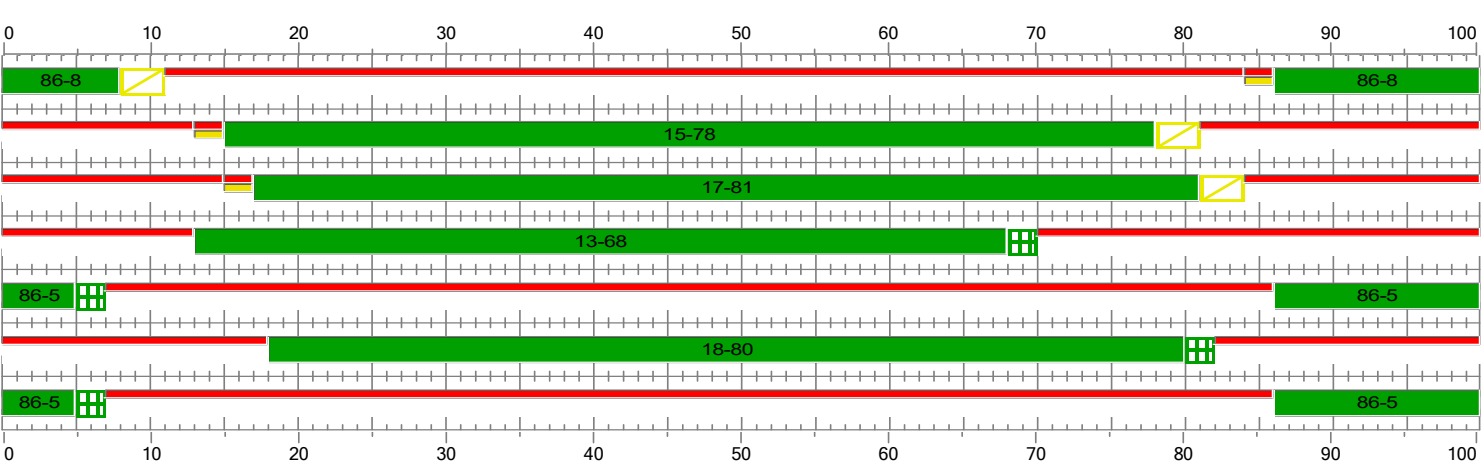

TVI(TFA)1	TVF(TFE)1	TFD1	RES
86	8	22	17
15	78	63	58
17	81	64	59
13	70	57	50
86	7	21	14
18	82	64	57
86	7	21	14

Punto de conexión
Punto de desconexión
SOP
ngos de punto de transi

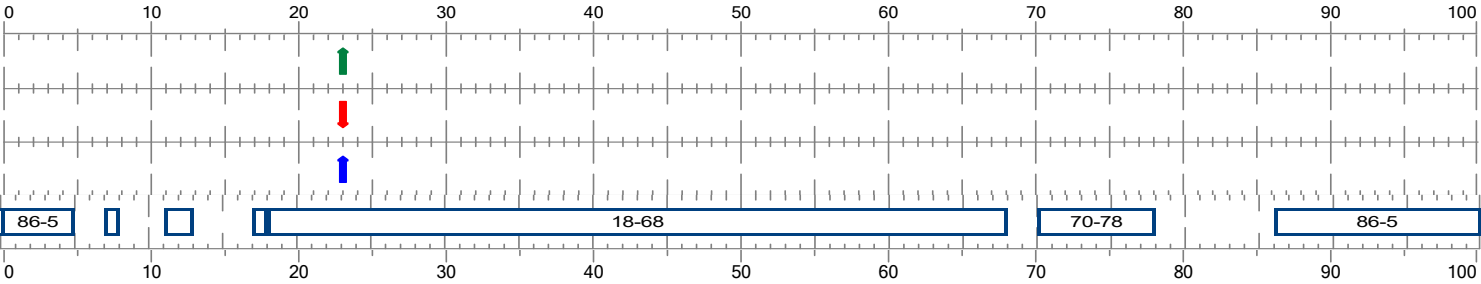

23
23
23


Último usuario / Última actualización = Ing. Arturo Coy Alvarado / 28/03/2025 2:01:47 p. m.

Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:05
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización			Sittraffic Office

Programas de señal \ PS_6_C900_2935

Ser. no.	O-Nr.	Nombre corto	Nombre	Descripción	Tiempo de Ciclo	No de Com. Dispo.	Tipo	Desfase	Tabla de volúmenes	MTI(ZZ)	MDI	MDF	COORDINACION	S-Encendido	S-Off	@Point-in-time values based on
6	6	PS_6_C900_2935	PS_6_C900_2935	Automatically generated	90	6	SG	0		MI_C900_2935			0	PC_C900_2935	PD_C900_2935	0


Grupo de señales
2
3
4
22
24
32
33

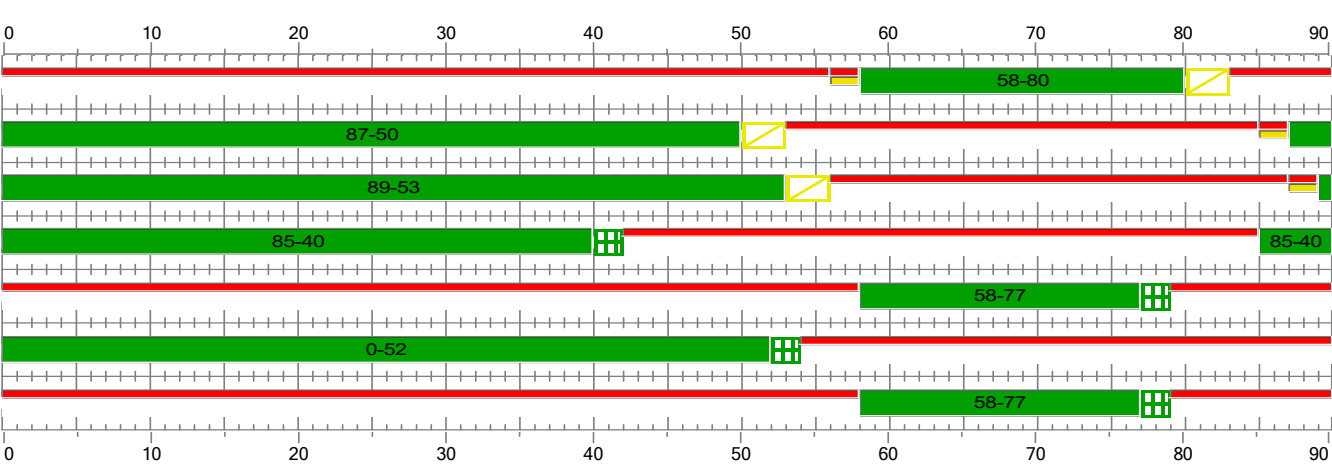

TVI(TFA)1	TVF(TFE)1	TFD1	RES
58	80	22	17
87	50	53	48
89	53	54	49
85	42	47	40
58	79	21	14
0	54	54	47
58	79	21	14

= Verde = Rojo = v.int_2Hz = Amarillo = RojoAmarillo

Punto de conexión
Punto de desconexión
SOP
ngos de punto de transi

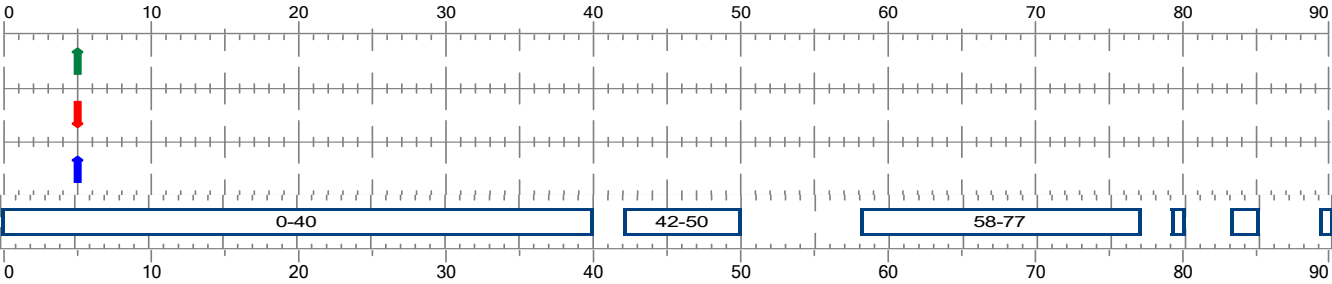

5
5
5


Último usuario / Última actualización = Ing. Arturo Coy Alvarado / 28/03/2025 2:01:34 p. m.

Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:05
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización			Sittraffic Office


Programas de señal \ PS_7_C900_2935

Ser. no.	O-Nr.	Nombre corto	Nombre	Descripción	Tiempo de Ciclo	No de Com. Dispo.	Tipo	Desfase	Tabla de volúmenes	MTI(ZZ)	MDI	MDF	COORDINACION	S-Encendido	S-Off	@Point-in-time values based on
7	7	PS_7_C900_2935	PS_7_C900_2935	Automatically generated	75	7	SG	0		MI_C900_2935			0	PC_C900_2935	PD_C900_2935	0

Grupo de señales
2
3
4
22
24
32
33

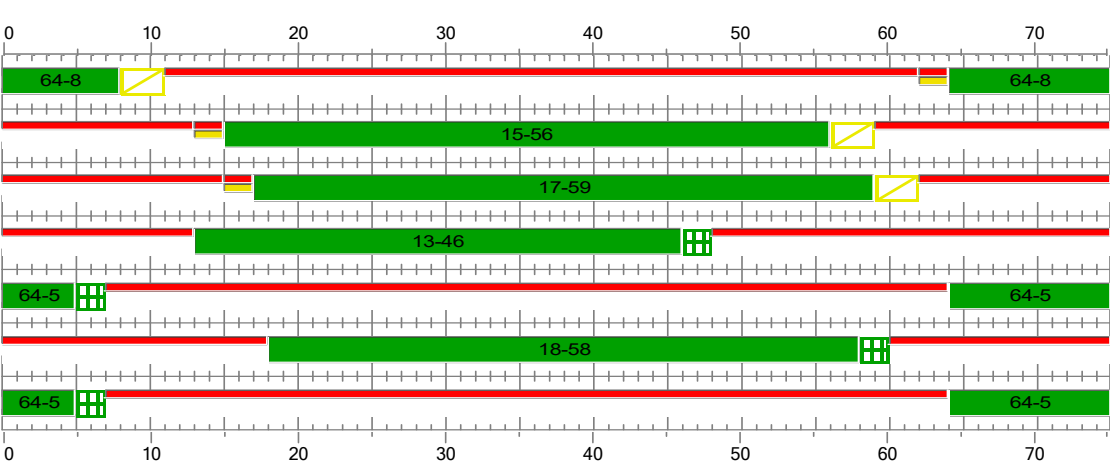

TVI(TFA)1	TVF(TFE)1	TFD1	RES
64	8	19	14
15	56	41	36
17	59	42	37
13	48	35	28
64	7	18	11
18	60	42	35
64	7	18	11

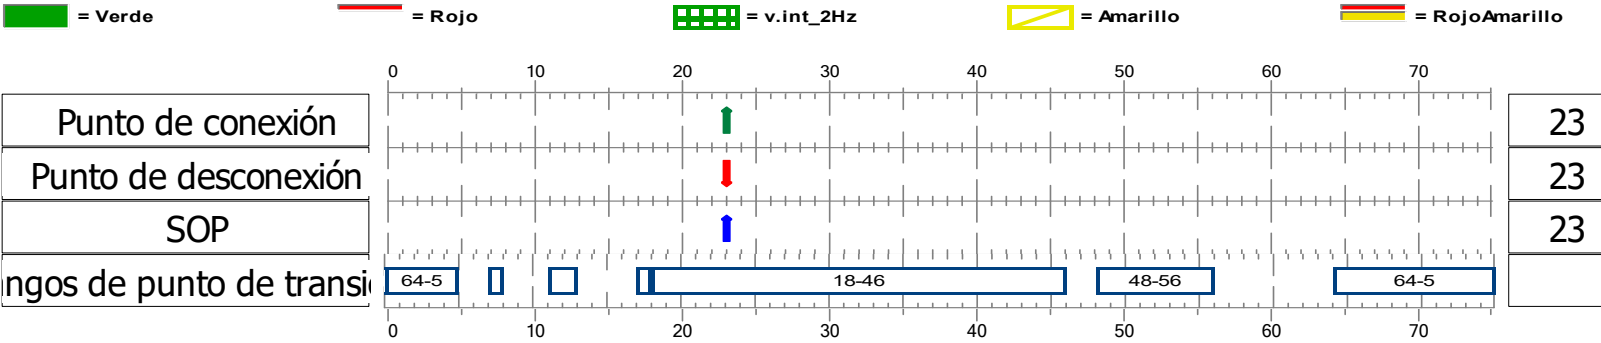


Último usuario / Última actualización = Ing. Arturo Coy Alvarado / 28/03/2025 2:02:22 p. m.

Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:05
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización		Sittraffic Office	


Programas de señal \ PS_8_C900_2935

Ser. no.	O-Nr.	Nombre corto	Nombre	Descripción	Tiempo de Ciclo	No de Com. Dispo.	Tipo	Desfase	Tabla de volúmenes	MTI(ZZ)	MDI	MDF	COORDINACION	S-Encendido	S-Off	@Point-in-time values based on
8	8	PS_8_C900_2935	PS_8_C900_2935	Automatically generated	105	8	SG	0		MI_C900_2935			0	PC_C900_2935	PD_C900_2935	0

Grupo de señales
2
3
4
22
24
32
33

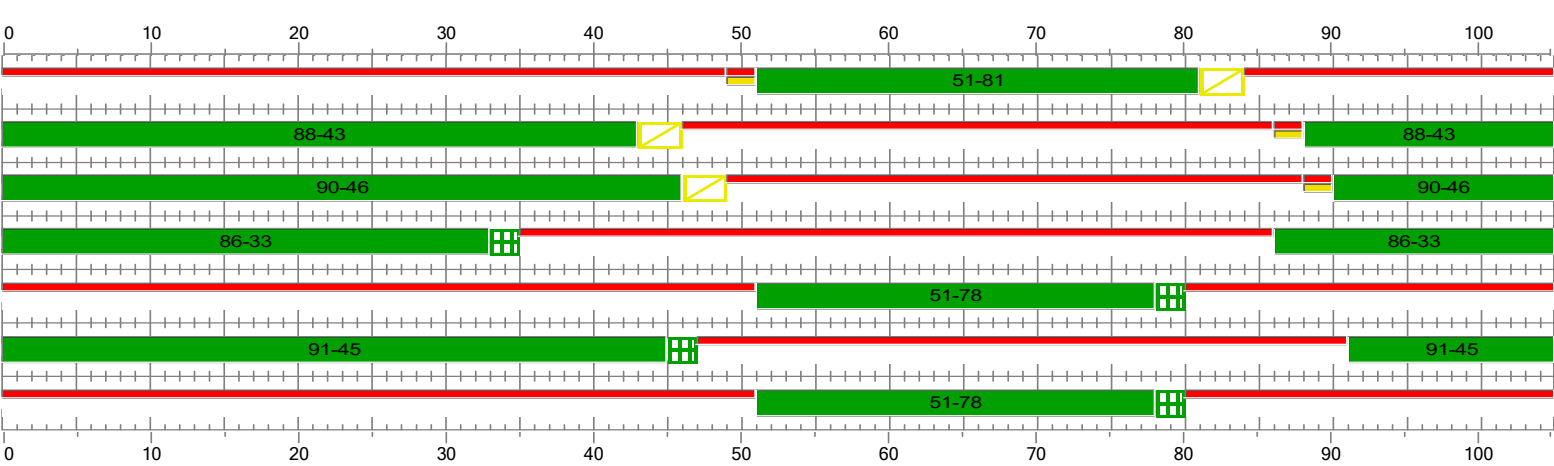

TVI(TFA)1	TVF(TFE)1	TFD1	RES
51	81	30	25
88	43	60	55
90	46	61	56
86	35	54	47
51	80	29	22
91	47	61	54
51	80	29	22

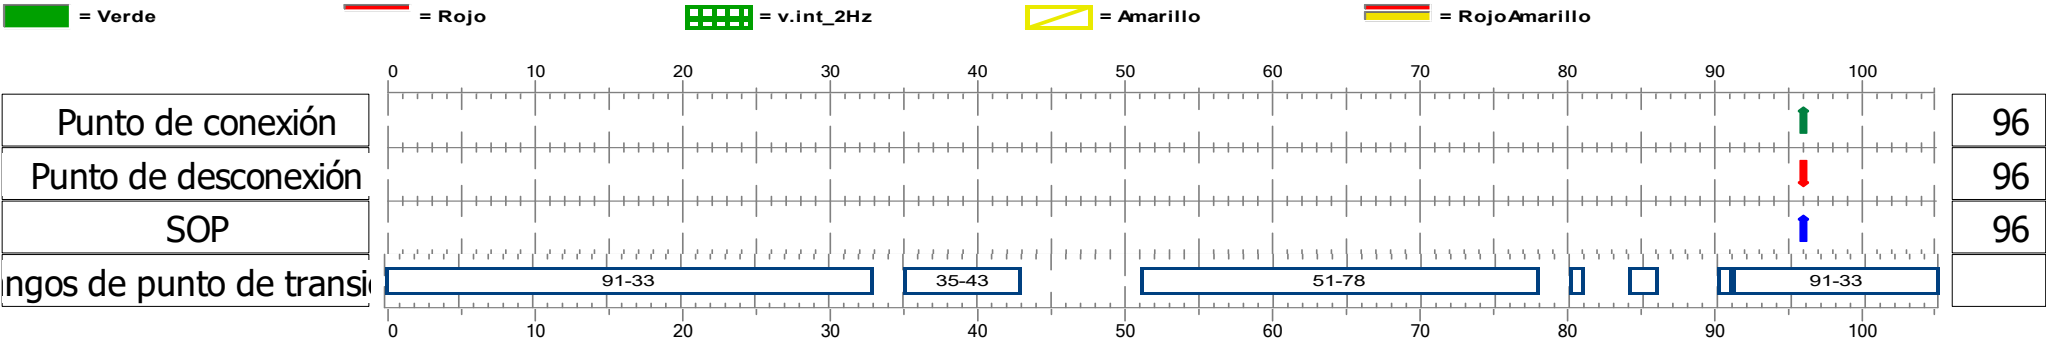


Último usuario / Última actualización = Ing. Arturo Coy Alvarado / 28/03/2025 2:02:42 p. m.

Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:05
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización			Sittraffic Office

Programas de señal \ PS_9_C900_2935

Ser. no.	O-Nr.	Nombre corto	Nombre	Descripción	Tiempo de Ciclo	No de Com. Dispo.	Tipo	Desfase	Tabla de volúmenes	MTI(ZZ)	MDI	MDF	COORDINACION	S-Encendido	S-Off	@Point-in-time values based on
9	9	PS_9_C900_2935	PS_9_C900_2935	Automatically generated	105	9	SG	0		MI_C900_2935			0	PC_C900_2935	PD_C900_2935	0


Grupo de señales
2
3
4
22
24
32
33

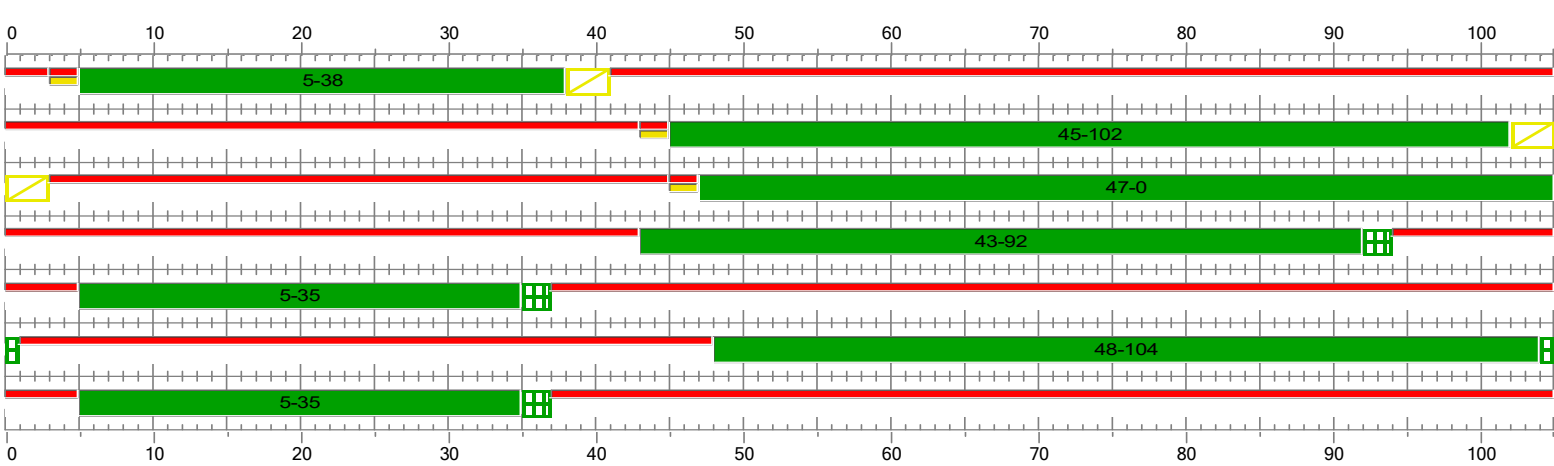

TVI(TFA)1	TVF(TFE)1	TFD1	RES
5	38	33	28
45	102	57	52
47	0	58	53
43	94	51	44
5	37	32	25
48	1	58	51
5	37	32	25

= Verde = Rojo = v.int_2Hz = Amarillo = RojoAmarillo

Punto de conexión
Punto de desconexión
SOP
ngos de punto de transi

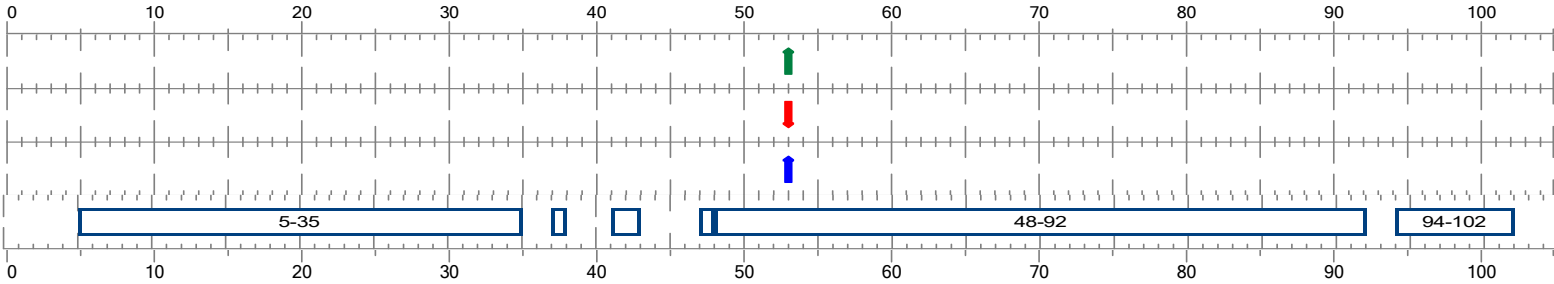

53
53
53

Último usuario / Última actualización = Ing. Arturo Coy Alvarado / 28/03/2025 2:03:03 p. m.

Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:05
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización			Sittraffic Office

Detectores

No.	Nombre corto	Nombre	Descripción	Tipo de modelo	Distancia Det	Posición	Longitud	Longitud de cola	Cruce	SG	Distancia SL	GL-Alfa1	GL-Alfa2	Umbral	Mexwa intervalo	Modo	Tipo de conexión	Espacio de conexión	Canal de conexión	IndiceExt	ErrorInput	Areas de plausibilidad1	Areas de plausibilidad2
1	W.2.1	W.2.1		Vídeo				-	---			PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	0	60	Estándar	A BORDO	0	1		0	Predeterminado	Predeterminado
2	W.2.2	W.2.2		Vídeo				-	---			PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	0	60	Estándar	A BORDO	0	2		0	Predeterminado	Predeterminado
3	W.3.1	W.3.1		Vídeo			0	-	---		3,223	PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	0	60	Estándar	A BORDO	0	3		0	Predeterminado	Predeterminado
4	W.3.2	W.3.2		Vídeo			0	-	---		3,131	PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	0	60	Estándar	A BORDO	0	4		0	Predeterminado	Predeterminado
5	W.3.3	W.3.3		Vídeo			0	-	---		3,312	PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	0	60	Estándar	A BORDO	0	5		0	Predeterminado	Predeterminado
6	N.2.2	N.2.2		Vídeo				-	---			PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	0	60	Estándar	A BORDO	0	6		0	Predeterminado	Predeterminado
7	N.2.1	N.2.1		Vídeo				-	---			PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	0	60	Estándar	A BORDO	0	7		0	Predeterminado	Predeterminado

No.	Areas de plausibilidad3	Areas de plausibilidad4
1	Predeterminado	Predeterminado
2	Predeterminado	Predeterminado
3	Predeterminado	Predeterminado
4	Predeterminado	Predeterminado
5	Predeterminado	Predeterminado
6	Predeterminado	Predeterminado
7	Predeterminado	Predeterminado

Carril de viaje para detectores

Nombre	Carril	SG	Distancia a la línea de parada [m]
W.2.1	Bz2: Carril2.2, Al frente	2	5,173
W.2.2	Bz2: Carril2.1, Al frente	2	5,344
N.2.1	Bz2: Carril2.2, Al frente	2	30,241
N.2.2	Bz2: Carril2.1, Al frente	2	36,349
W.3.1	Bz3: Carril3.3, Al frente	3	3,223
W.3.2	Bz3: Carril3.2, Al frente	3	3,131
W.3.3	Bz3: Carril3.1, Al frente	3	3,312

Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 14:48
Contrato:	Profesional Universitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización		Sittraffic Office	

EXTERNO

2935

DIRECCIÓN: KR 104 X DG 16

Fase	Prioridad	Fase Destino	Condición de Demanda	Condición de Extensión
1	1	2	PD	-
2	1	1	PD	G_2

Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:05
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización		Sittraffic Office	

Secuencia de fases



Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:05
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización		Sittraffic Office	

PARAMETROS_CA

INES_Max_Reduce_StD

Tabelle1

	Max_Red_StD1	Max_Red_StD2	Max_Red_StD3	Max_Red_StD4	Max_Red_StD5	Max_Red_StD6	Max_Red_StD7	Max_Red_StD8	Max_Red_StD9
No1	10	10	10	10	10	10	10	10	10
No2	4	10	8	10	3	3	0	6	8

INES_Max_Prolong_StD


Tabelle1

	Max_Pri_StD1	Max_Pri_StD2	Max_Pri_StD3	Max_Pri_StD4	Max_Pri_StD5	Max_Pri_StD6	Max_Pri_StD7	Max_Pri_StD8	Max_Pri_StD9
No1	4	10	8	10	3	3	0	6	8
No2	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:09
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización			Sittraffic Office

Transiciones de fase \ TF_1.2_C900_2935


Seq.no.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Duración	Desde fase	A fase	O no. BS	O no. TA	Subnodo(TK)	SubTransNr	SubTransVer	MTI(ZZ)	MDI	MDF	Probado	Apagar transito	SY-/FO-Identificación(EPS)
1	TF_1.2_C900_2935	TF_1.2		23	Fase 1	Fase 2	1	1	1	0	1	MI_C900_2935					Ninguno

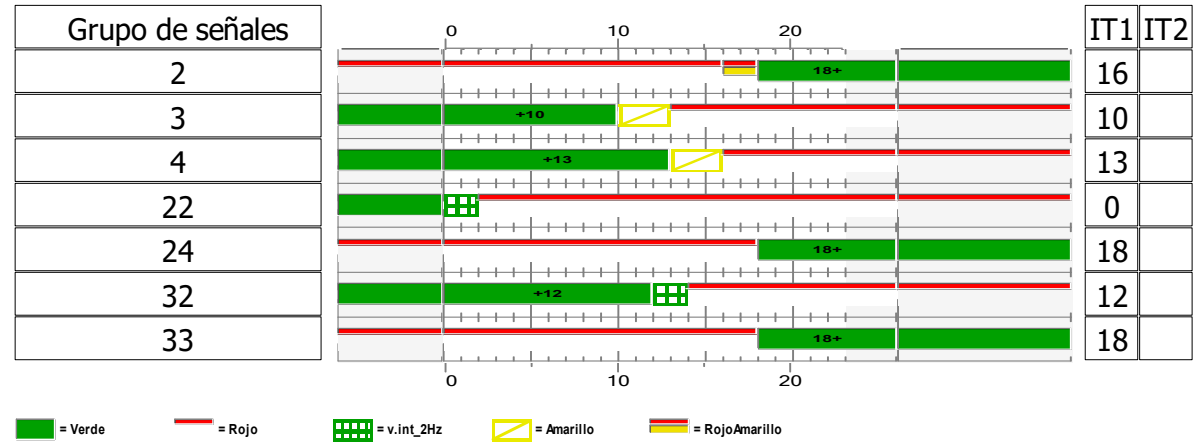

Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:06
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización			Sittraffic Office

Transiciones de fase \ TF_2.1_C900_2935

Seq.no.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Duración	Desde fase	A fase	O no. BS	O no. TA	Subnodo(TK)	SubTransNr	SubTransVer	MTI(ZZ)	MDI	MDF	Probado	Apagar transito	SY-/FO-Identificación(EPS)
2	TF_2.1_C900_2935	TF_2.1		18	Fase 2	Fase 1	2	2	1	0	1	MI_C900_2935					Ninguno

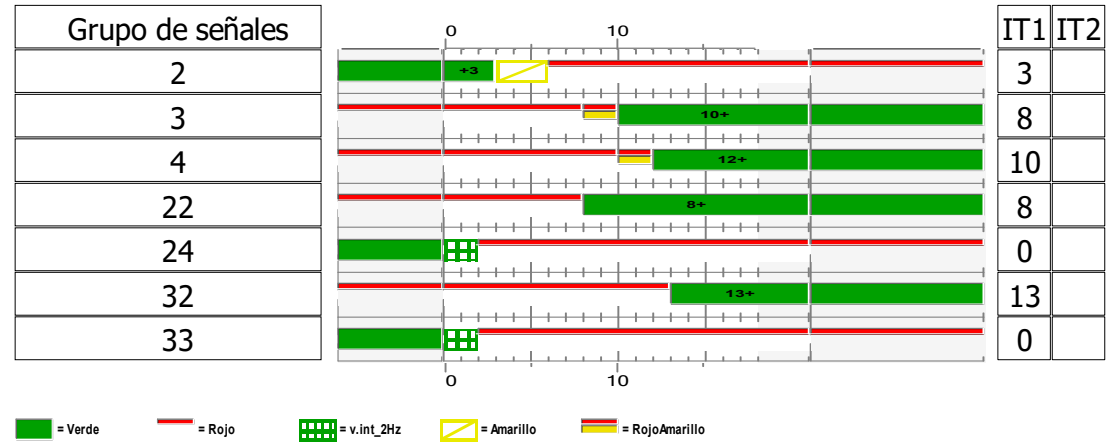


Verde = Verde, Rojo = Rojo, v.int_2Hz = v.int_2Hz, Amarillo = Amarillo, RojoAmarillo = RojoAmarillo

Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:06
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización			Sittraffic Office

Planes de permisividad de fase \ PP_1_C900_2935


Ser. no.	O-Nr.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Programa de señal	Tiempo de Ciclo	Punto de conexión	Punto de desconexión	SOP	Plan de secuencia de fases	Segundo inicial
1	1	PP_1_C900_2935	PP_1_C900_2935		PS_1_C900_2935	120	78	78	78	SF_C900_2935	0

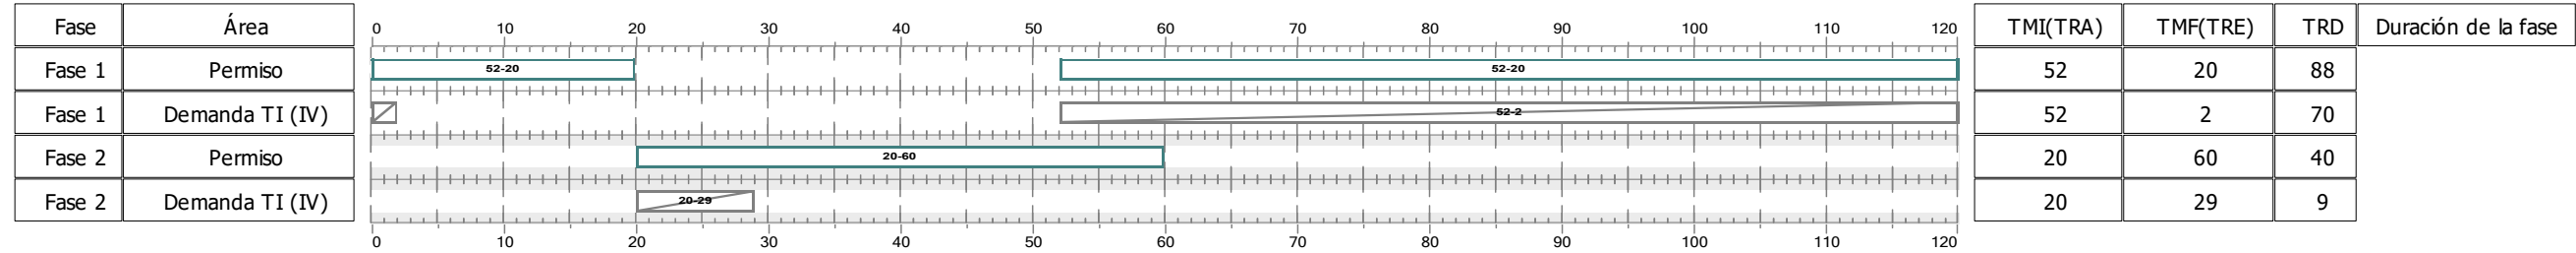

Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:08
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización			Sittraffic Office

Planes de permisividad de fase \ PP_2_C900_2935

Ser. no.	O-Nr.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Programa de señal	Tiempo de Ciclo	Punto de conexión	Punto de desconexión	SOP	Plan de secuencia de fases	Segundo inicial
2	2	PP_2_C900_2935	PP_2_C900_2935		PS_2_C900_2935	120	111	111	111	SF_C900_2935	0

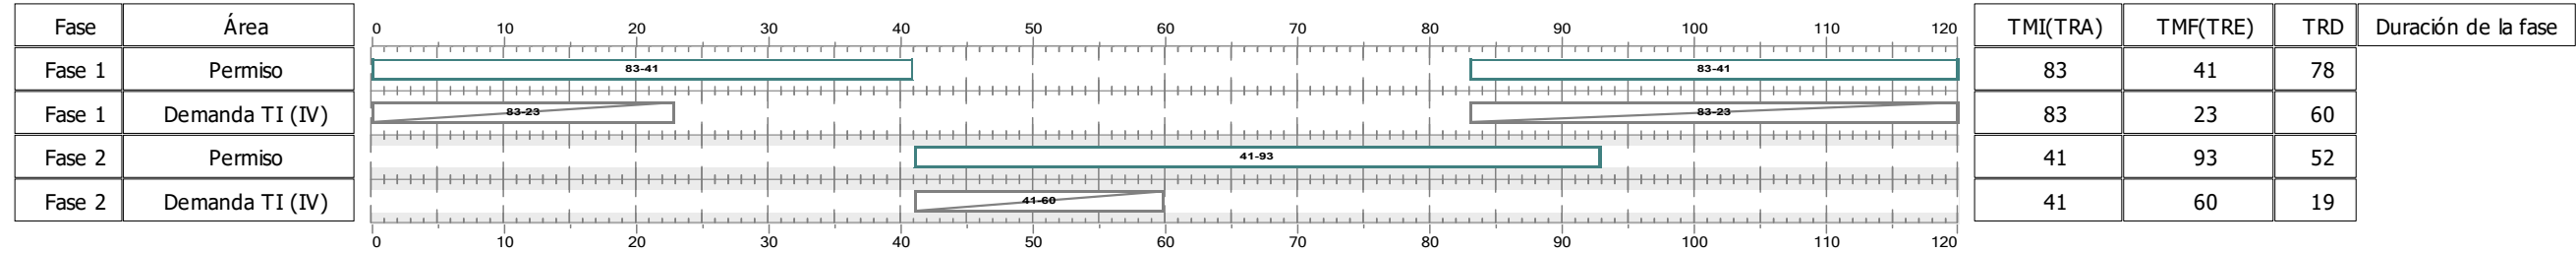


Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:08
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización			Sittraffic Office

Planes de permisividad de fase \ PP_3_C900_2935

Ser. no.	O-Nr.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Programa de señal	Tiempo de Ciclo	Punto de conexión	Punto de desconexión	SOP	Plan de secuencia de fases	Segundo inicial
3	3	PP_3_C900_2935	PP_3_C900_2935		PS_3_C900_2935	120	107	107	107	SF_C900_2935	0

Fase	Área
Fase 1	Permiso
Fase 1	Demanda TI (IV)
Fase 2	Permiso
Fase 2	Demanda TI (IV)




TMI(TRA)	TMF(TRE)	TRD	Duración de la fase
79	40	81	
79	22	63	
40	89	49	
40	56	16	

Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:08
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización			Sittraffic Office

Planes de permisividad de fase \ PP_4_C900_2935

Ser. no.	O-Nr.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Programa de señal	Tiempo de Ciclo	Punto de conexión	Punto de desconexión	SOP	Plan de secuencia de fases	Segundo inicial
4	4	PP_4_C900_2935	PP_4_C900_2935		PS_4_C900_2935	120	47	47	47	SF_C900_2935	0

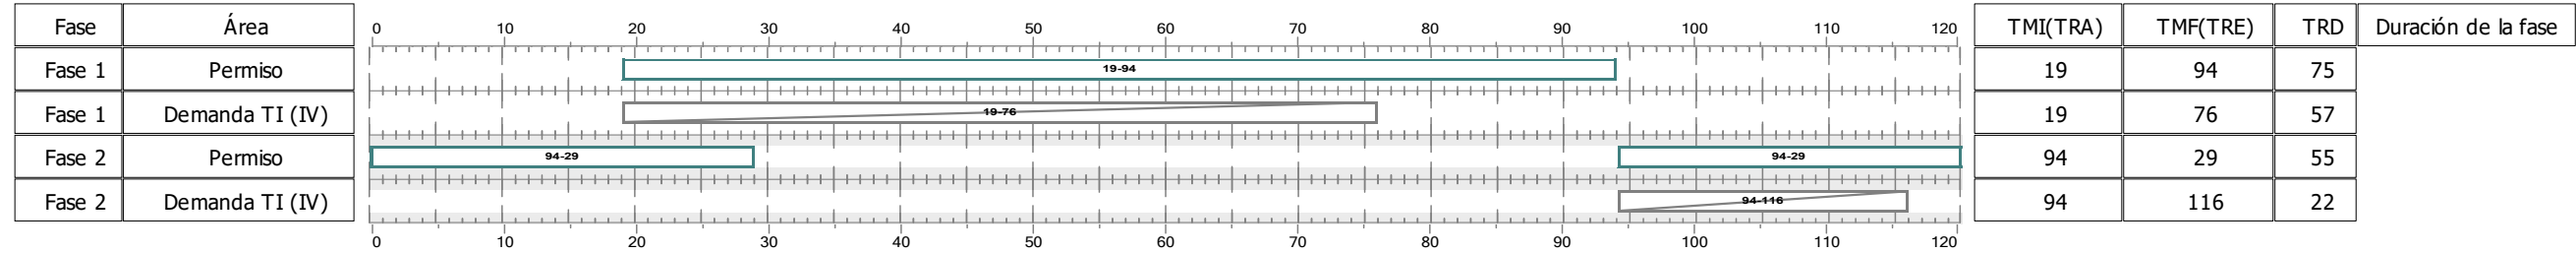


Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:08
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización			Sittraffic Office

Planes de permisividad de fase \ PP_5_C900_2935

Ser. no.	O-Nr.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Programa de señal	Tiempo de Ciclo	Punto de conexión	Punto de desconexión	SOP	Plan de secuencia de fases	Segundo inicial
5	5	PP_5_C900_2935	PP_5_C900_2935		PS_5_C900_2935	100	23	23	23	SF_C900_2935	0

Fase	Área
Fase 1	Permiso
Fase 1	Demanda TI (IV)
Fase 2	Permiso
Fase 2	Demanda TI (IV)




TMI(TRA)	TMF(TRE)	TRD	Duración de la fase
0	68	68	
0	50	50	
68	5	37	
68	77	9	

Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:08
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización			Sittraffic Office

Planes de permisividad de fase \ PP_6_C900_2935

Ser. no.	O-Nr.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Programa de señal	Tiempo de Ciclo	Punto de conexión	Punto de desconexión	SOP	Plan de secuencia de fases	Segundo inicial
6	6	PP_6_C900_2935	PP_6_C900_2935		PS_6_C900_2935	90	5	5	5	SF_C900_2935	0

Fase	Área
Fase 1	Permiso
Fase 1	Demanda TI (IV)
Fase 2	Permiso
Fase 2	Demanda TI (IV)




TMI(TRA)	TMF(TRE)	TRD	Duración de la fase
72	40	58	
72	22	40	
40	77	37	
40	49	9	

Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:08
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización			Sittraffic Office

Planes de permisividad de fase \ PP_7_C900_2935

Ser. no.	O-Nr.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Programa de señal	Tiempo de Ciclo	Punto de conexión	Punto de desconexión	SOP	Plan de secuencia de fases	Segundo inicial
7	7	PP_7_C900_2935	PP_7_C900_2935		PS_7_C900_2935	75	23	23	23	SF_C900_2935	0

Fase	Área
Fase 1	Permiso
Fase 1	Demanda TI (IV)
Fase 2	Permiso
Fase 2	Demanda TI (IV)




TMI(TRA)	TMF(TRE)	TRD	Duración de la fase
1	46	45	
1	28	27	
46	5	34	
46	53	7	

Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:08
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización			Sittraffic Office

Planes de permisividad de fase \ PP_8_C900_2935

Ser. no.	O-Nr.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Programa de señal	Tiempo de Ciclo	Punto de conexión	Punto de desconexión	SOP	Plan de secuencia de fases	Segundo inicial
8	8	PP_8_C900_2935	PP_8_C900_2935		PS_8_C900_2935	105	96	96	96	SF_C900_2935	0

Fase	Área
Fase 1	Permiso
Fase 1	Demanda TI (IV)
Fase 2	Permiso
Fase 2	Demanda TI (IV)




TMI(TRA)	TMF(TRE)	TRD	Duración de la fase
68	33	70	
68	15	52	
33	78	45	
33	45	12	

Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:08
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización			Sittraffic Office

Planes de permisividad de fase \ PP_9_C900_2935

Ser. no.	O-Nr.	Nombre	Nombre corto	Descripción	Programa de señal	Tiempo de Ciclo	Punto de conexión	Punto de desconexión	SOP	Plan de secuencia de fases	Segundo inicial
9	9	PP_9_C900_2935	PP_9_C900_2935		PS_9_C900_2935	105	53	53	53	SF_C900_2935	0




Fase	Área
Fase 1	Permiso
Fase 1	Demanda TI (IV)
Fase 2	Permiso
Fase 2	Demanda TI (IV)



TMI(TRA)	TMF(TRE)	TRD	Duración de la fase
25	92	67	
25	74	49	
92	35	48	
92	2	15	

Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:08
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización			Sittraffic Office

PROTOCOLO DE PRUEBA_PS_2

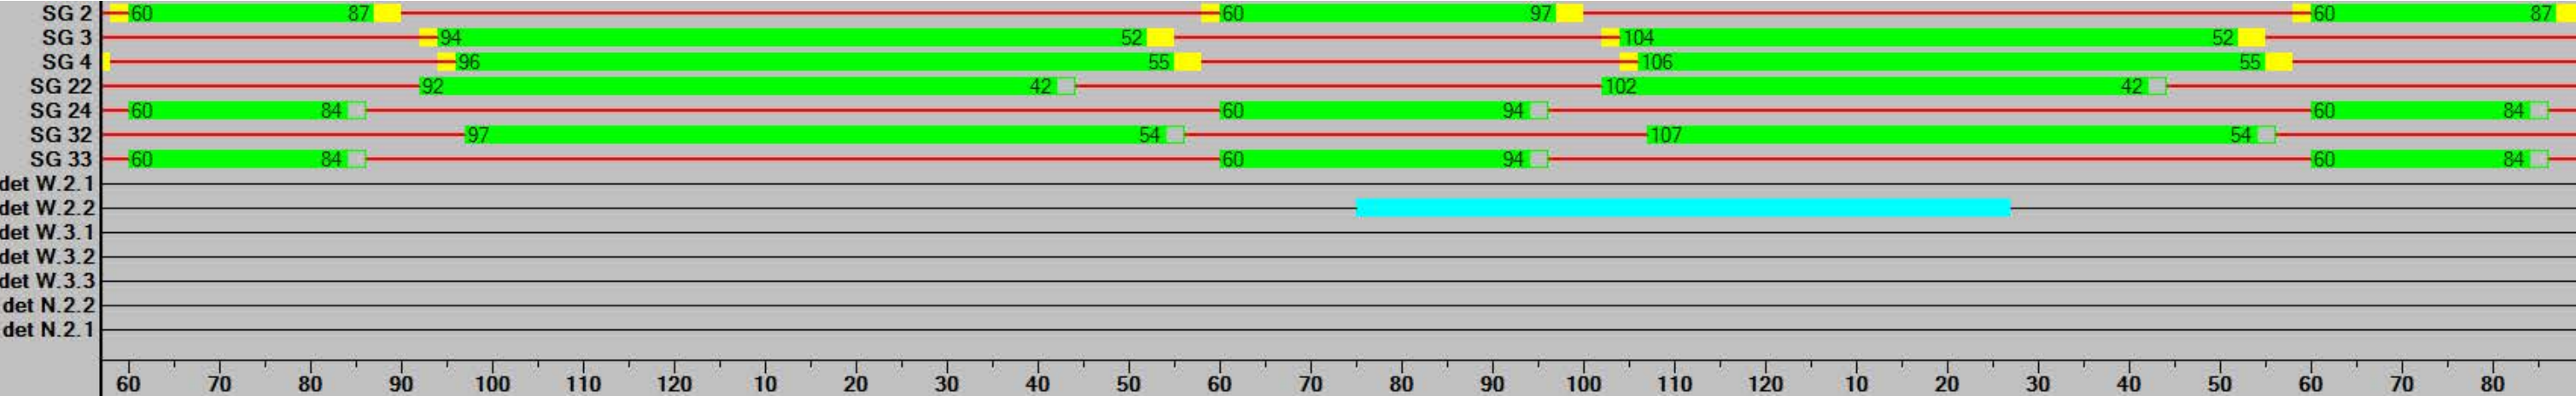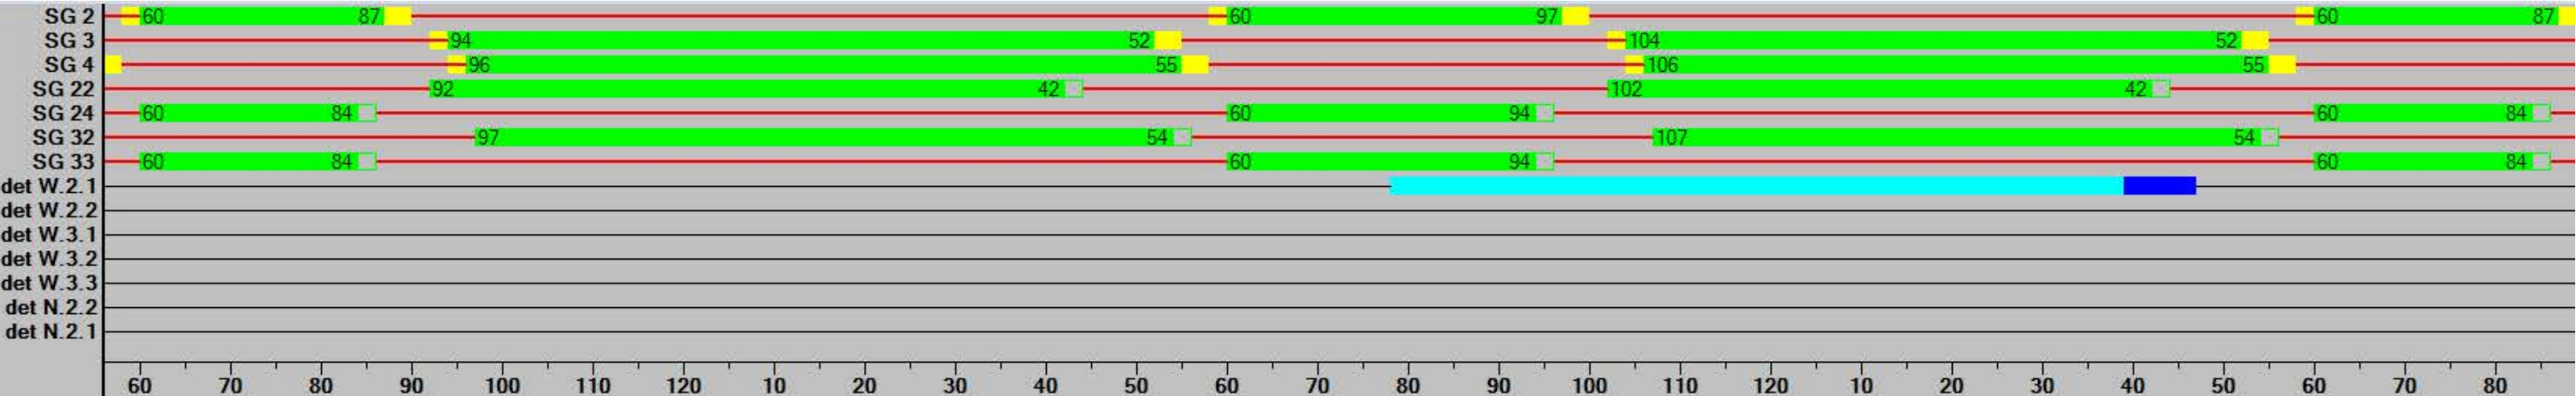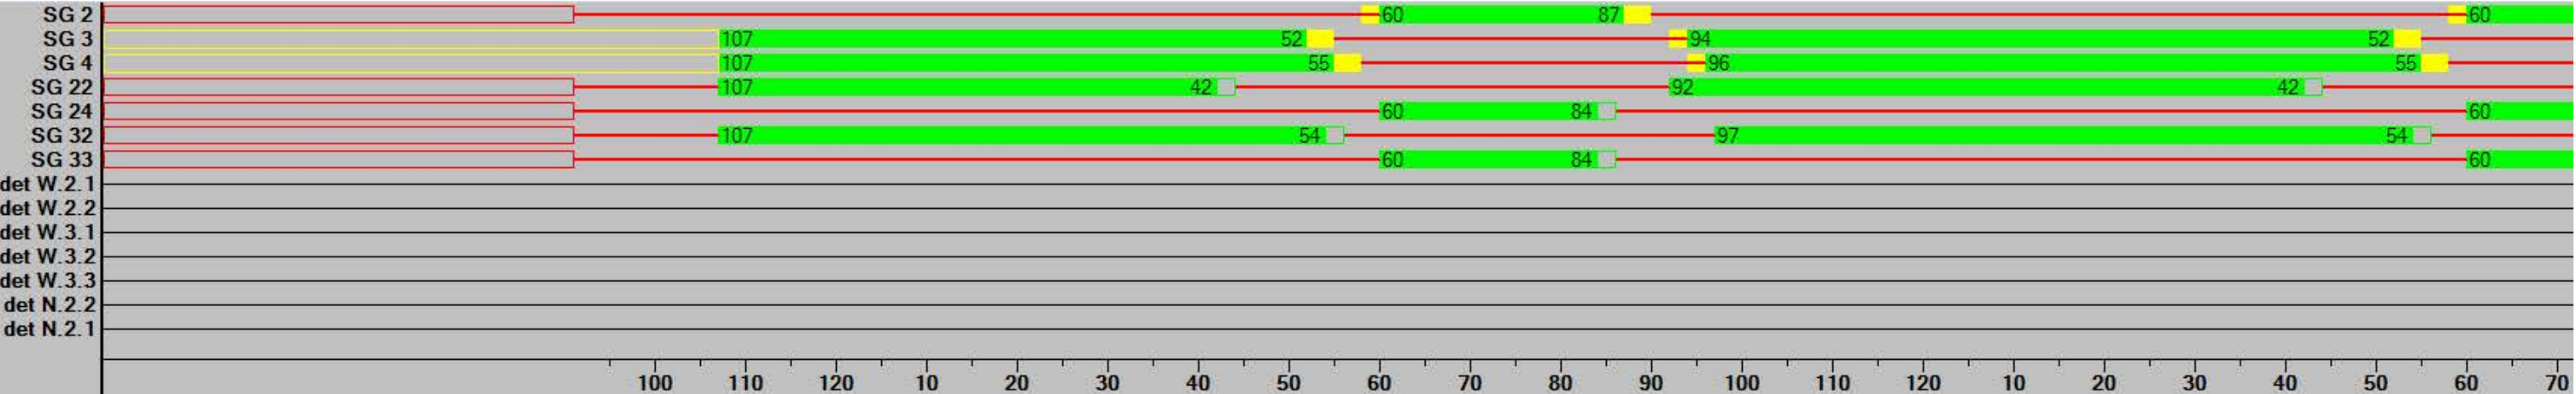

Externo:	2935	Dirección:	KR 104 X DG 16	Zona Auto:	2401
Encargado:	Ing. Arturo Coy Alvarado	Versión:	SEMA_2935_Versión1.sop6	Fecha:	28/03/2025 15:05
Contrato:	Profesional U niversitario SDM	SDM - Subdirección de Semaforización			Sittraffic Office
